Взамен акта № 60/2015 от 27.10.2015 г.

АКТ
об осуществлении технологического присоединения

N 2/35 от "10" 07. 2017 г.

Настоящий акт составлен **Акционерным обществом Омским производственным объединением «Иртыш»,** именуемым в дальнейшем сетевой организацией, в лице главного инженера Калякина Александра Александровича, действующего на основании доверенности № 4 от 09.01.2017 г., с одной стороны, и

Индивидуальным предпринимателем Кацманом Вадимом Валерьевичем, именуемым в дальнейшем заявитель, действующего на основании ОГРН ИП 310554322200169 от 10.08.2010 г, с другой стороны, совместно именуемые стороны, оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от __---_ N _-----_ в полном объеме на сумму _---_ р. --_ копеек, в том числе НДС _-----__руб (------) _----_ копеек (прописью). <1>

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям:
ТУ № 35-3/2015 от 31.03.2015 г. АО ОмПО «Иртыш»;
Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу:
г. Омск, ул. ЛАО, ул. 10-я Чередовая, Д.9.
Акт о выполнении технических условий: № 121 от 26.06.2015 г.
Дата фактического присоединения 26.06.2015 г , акт об осуществлении технологического присоединения:
№ б/н от 26.06.2015 г.<2>

Характеристики присоединения:

максимальная мощность (всего) 322**,0 кВт**, в том числе:
максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 322,0кВт;
ранее присоединенная максимальная мощность 0 кВт; <3>
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 0 кВА.
Категория надежности электроснабжения: 2.

2. Перечень точек присоединения:

N	Источник питания	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg φ)
1	ТП-3060 РУ-0,4кВ	Ф-21 На нижних губках коммутационного аппарата Ф -21 РУ-0,4кВ, ТП-3060	0,4кВ	161,0	-	0,4
2	ТП-3060 РУ-0,4кВ	Ф-26 На нижних губках коммутационного аппарата Ф -26 РУ-0,4кВ, ТП-3060	0,4кВ	161,0	-	0,4
в том числе опосредованно присоединенные						
-	-	-	-	-	-	-

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)	Описание границ эксплуатационной ответственности сторон
Границы балансовой принадлежности с Заявителем установлены на наконечниках н/в кабелей Ф-21, Ф-26 в РУ-0,4кВ ТП-3060	Границы эксплуатационной принадлежности с Заявителем установлены на наконечниках н/в кабелей Ф-21, Ф-26 в РУ-0,4кВ ТП-3060

3. У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
Коммутационные аппараты Ф-21, Ф-26 РУ-0,4кВ, ТП-3060 находятся на балансе ТСО АО ОмПО «Иртыш»	комплекс коммерческих учетов электрической энергии в «точке поставки» эл/энергии; н/в кабели 2 АВБбшв-1 4х185,0мм² L-198,5 м (каждая) , н/в кабели 2 АВБбшв-1 4х185,0мм² L-198,5 м (каждая) от нижних губок коммутационных аппаратов Ф-21, Ф-26 РУ-0,4кВ ТП-3060 до верхних губок вводных коммутационных аппаратов ВРУ мжд № 9 по ул. 10-я Чередовая на балансе Заявителя;

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя
Коммутационные аппараты Ф-21, Ф-26 РУ-0,4кВ, ТП-3060 находятся в эксплуатационной ответственности ТСО АО ОмПО «Иртыш»	комплекс коммерческих учетов электрической энергии в «точке поставки» эл/энергии; н/в кабели 2 АВБбшв-1 4х185,0мм² L-198,5 м (каждая) , н/в кабели 2 АВБбшв-1 4х185,0мм² L-198,5 м (каждая) от нижних губок коммутационных аппаратов Ф-21, Ф-26 РУ-0,4кВ ТП-3060 до верхних губок вводных коммутационных аппаратов ВРУ мжд № 9 по ул. 10-я Чередовая в эксплуатационной ответственности Заявителя;

4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики:

_____.

(виды защиты и автоматики, действия и др.)

6. Автономный резервный источник питания:

_____.

(место установки, тип, мощность и др.)

7. Прочие сведения:

_____.

(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии и др.)

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств:

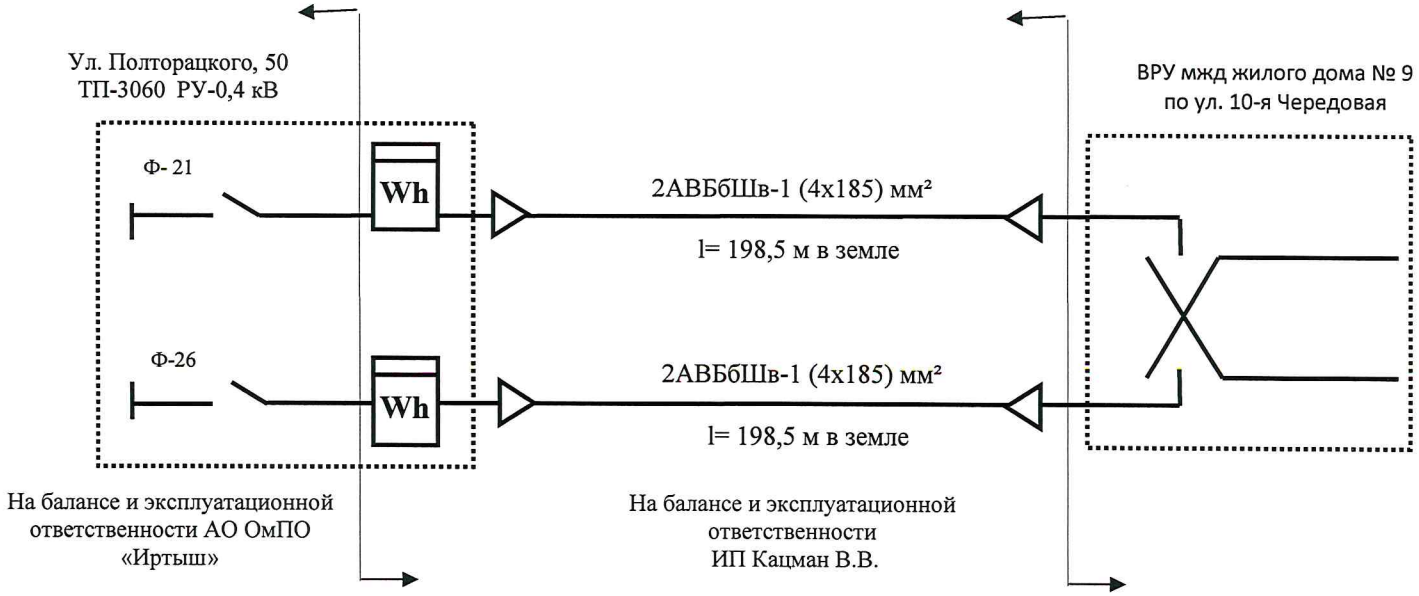

Прочее:

- Ответственность за состояние контактов в точке присоединения возлагается на Заявителя;
- Расчетные приборы учета электрической энергии заявителя установлены на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, условно-постоянные потери (кВтч в мес.) – 0, условно-переменные потери (%) – 0 (ноль)%;

9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами. Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет. <4>

Подписи сторон:

Акт подписали:

АО ОмПО «Иртыш»	Заявитель
Главный инженер (должность)	(должность)
Калякин А.А. (Ф. И. О.)	(Ф. И. О.)
(подпись)	(подпись)
М. П.	М. П.
Зам. главного энергетика (должность)	(должность)
Каюкова О.Г. (Ф. И. О.)	(Ф. И. О.)
(подпись)	(подпись)

<1> При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не вносится.

<2> Заполняется в случае переоформления документов.

<3>Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (энергетических установок).

<4> При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не вносится.
